
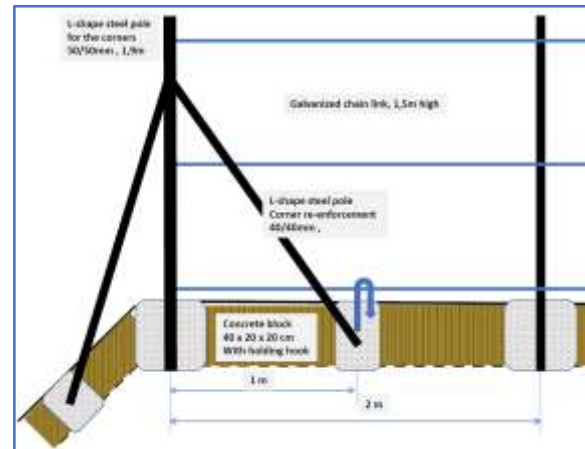


Sibanor Gemeenschapstuin Project Voortgangrapport dec 2017 – jan 2018

Aanvang december 2017

Samen met de aannemer werd het concept en de bouwtechniek van de omheining en de toegangspoort gedefinieerd.

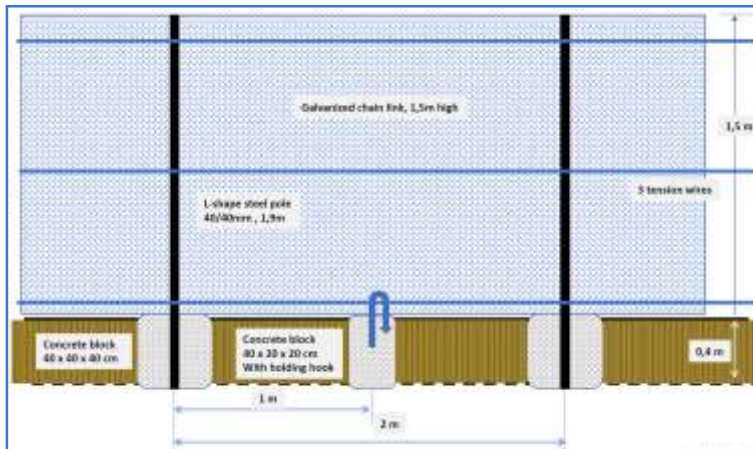

December 2017 – W49 / W50 en W51

Aankoop en klaarmaken van de metalen profielen:

- Metalen L-profielen van 5,8m – 40/40 mm; voor de hoeken van 50/50
- Elk profiel moest in 3 stukken van 1,90m gezaagd worden
- Alle 87 profielen werden geboord en daarna geschilderd met olievert

Bestellingen werden geplaatst voor de levering ter plaatse van cement, zand en kiezel.

Metalen hekwerk, hout voor bekisting en betonijzer voor funderingen.

December 2017 – W50 en W51

Het terrein werd door de dorpelingen ontdaan van alle begroeiingen.



Januari 2018 – W2 en W2

De opbouw van de omheining is gestart !



De fundering en kolommen voor de toegangspoort dienen nog bekeken te worden gezien de gerecupereerde metalen poort vrij zwaar blijkt. Spandraden en hekwerk kan nu geïnstalleerd worden. Verwacht wordt dat tegen eind januari, begin februari, de omheining volledig zal klaar zijn. Het boren en uitrusten van een waterput kan plaatsvinden eind februari .
